

TEST LOG

Article number: **110135GWS002**

Sprache | Language ☐ DE ☒ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Internal number: 1012317

Serial number: 9622083100240

Date: 29.06.2021

Device status:

Bemerkungen / Remarks:

- ☐ As good as new | unused
- ☒ Damaged (light) | technically inspected
- ☐ Damaged (dents/scratches) | technically checked
- ☐ Signs of wear (light) | technically checked
- ☐ Traces of use | technically checked

Product Specific Information

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| VDE test conducted: | ☒ YES | ☐ NO | ☐ NOT NECESSARY |
| Device complete: | ☒ YES | ☐ NO | |
| All functions tested: | ☒ YES | ☐ NO | |
| Device cleaned: | ☒ YES | ☐ NO | |

Packaging:

- ☐ Original packaging
- ☐ Original packaging (damaged)
- ☒ Substitute packaging

Picture 1




Picture 2



Picture 3




Picture 4

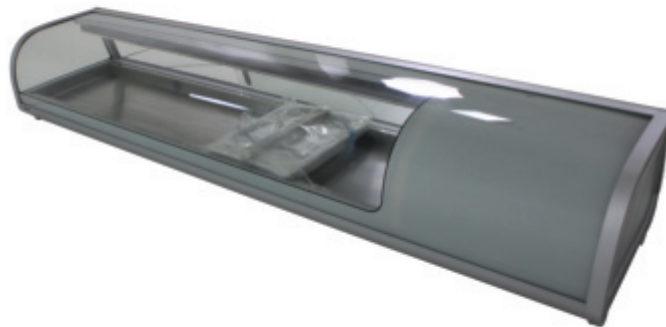

Picture 5



Picture 6



VDE Test Report | Note: The device has not been put into operation since the test

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702

Auftrag Nummer: 1012317			
Auftraggeber (Kunde): Bartscher		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine Str. 28 33154 Salzkotten	
Geräteart: SushiBar	Hersteller: Bartscher	Type: 110135G	
Ident.- Nr.: 9622083100240	Schutzkl.: SK I		
Heizleistung [W]: 0 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Prüfdatum: 29.06.2021	
Prüfung nach DIN VDE 0701-0702			
Besichtigung: [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung [OK] Isolierteile in Ordnung [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt [OK] Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.112 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 1.00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.06 mA	max 3.50 mA	OK
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	225 V	0 V	0 V
Strom [A]	1.13 A	0.00 A	0.00 A
Leistung [W]	144 W	0 W	0 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung: Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: 29.06.2022			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ SAFETYTEST 3N/3LN/1N/1L SN: D0000108		
Unterschriften			
Prüfer: MS		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: Salzkotten	Datum: 29.06.2021	Ort:	Datum: 29.06.2021
