

TEST LOG

Article number: **A120186WS004**

Sprache | Language ☐ DE ☒ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Internal number: 1015252

Serial number: 220704677

Date: 03.01.2023

Device status:

- ☐ As good as new | unused
- ☐ Damaged (light) | technically inspected
- ☐ Damaged (dents/scratches) | technically checked
- ☒ Signs of wear (light) | technically checked
- ☐ Traces of use | technically checked

Bemerkungen / Remarks:

Product Specific Information

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| VDE test conducted: | ☒ YES | ☐ NO | ☐ NOT NECESSARY |
| Device complete: | ☒ YES | ☐ NO | |
| All functions tested: | ☒ YES | ☐ NO | |
| Device cleaned: | ☒ YES | ☐ NO | |

Packaging:

- ☐ Original packaging
- ☒ Original packaging (damaged)
- ☐ Substitute packaging

Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4



Picture 5



Picture 6

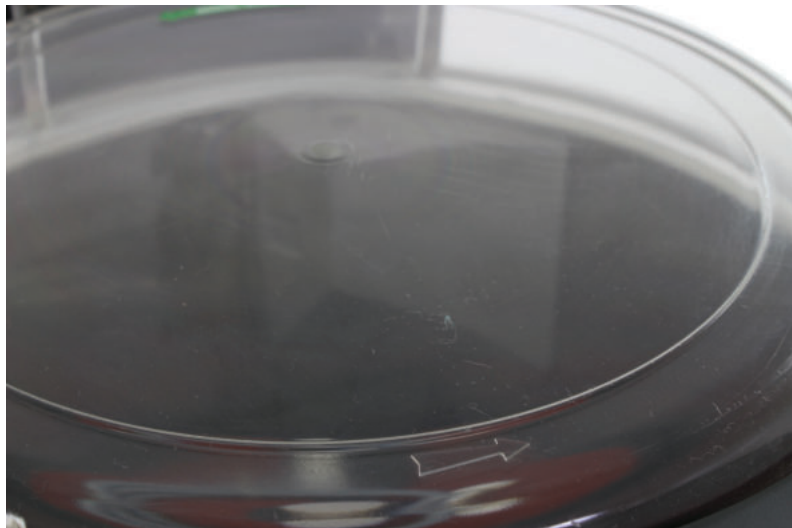

VDE Test Report | Note: The device has not been put into operation since the test

**Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte
und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702**

Auftrag Nummer: 1015252			
Auftraggeber (Kunde):		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine Str. 28 33154 Salzkotten	
Geräteart: Kartoffelschälmaschine	Hersteller: Bartscher	Type: A120186	
Ident.- Nr.: 220704677	Schutzkl.: SK I		
Heizleistung [W]: 0 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Prüfdatum: 03.01.2023	
Prüfung nach DIN VDE 0701-0702			
Besichtigung: [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung [OK] Isolierteile in Ordnung [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt [OK] Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.082 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 1.00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.12 mA	max 3.50 mA	OK
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	224 V	0 V	0 V
Strom [A]	7.09 A	0.00 A	0.00 A
Leistung [W]	717 W	0 W	0 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung: Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: 03.01.2024			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ SAFETYTEST 3N/3LN/1N/1L SN: D0000108		
Unterschriften			
Prüfer: AV		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: Salzkotten	Datum: 03.01.2023	Ort:	Datum: 03.01.2023
