

TEST LOG

Article number: **117723WS001**

Sprache | Language ☐ DE ☒ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Internal number: 1016381

Serial number: 42960423

Date: 04.08.2023

Device status:

- ☐ As good as new | unused
- ☐ Damaged (light) | technically inspected
- ☒ Damaged (dents/scratches) | technically checked
- ☐ Signs of wear (light) | technically checked
- ☐ Traces of use | technically checked

Bemerkungen / Remarks:

Product Specific Information

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| VDE test conducted: | ☒ YES | ☐ NO | ☐ NOT NECESSARY |
| Device complete: | ☒ YES | ☐ NO | |
| All functions tested: | ☒ YES | ☐ NO | |
| Device cleaned: | ☒ YES | ☐ NO | |


Packaging:

- ☐ Original packaging
- ☒ Original packaging (damaged)
- ☐ Substitute packaging

Picture 1



Picture 2

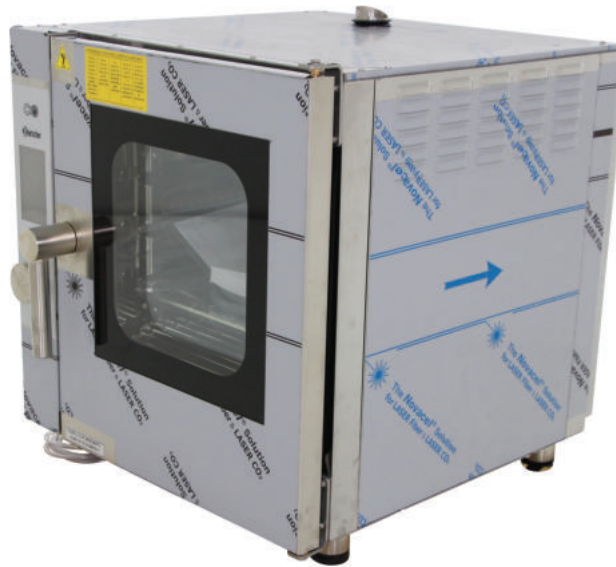

Picture 3



Picture 4



Picture 5



Picture 6



VDE Test Report | Note: The device has not been put into operation since the test

**Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte
und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702**

Auftrag Nummer: 1016381			
Auftraggeber (Kunde):		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine Str. 28 33154 Salzkotten	
Geräteart: Kombidämpfer Silversteam 5230DRS	Hersteller: Bartscher	Type: 117723	
Ident.-Nr.: 1016381 SN 42960423	Schutzkl.: SK I	01.04.2023	
Heizleistung [W]: 3.5 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Prüfdatum: 04.08.2023	
Prüfung nach DIN VDE 0701-0702			
Besichtigung: [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung [OK] Isolierteile in Ordnung [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt [OK] Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.049 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 0.30 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	2.02 mA	max 3.50 mA	OK
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	226 V	0 V	0 V
Strom [A]	13.86 A	0.00 A	0.00 A
Leistung [W]	3016 W	0 W	0 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung: Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: 04.08.2024			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ SAFETYTEST 3N/3LN/1N/1L SN: D0000108		
Unterschriften			
Prüfer: KB		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort:	Datum: 04.08.2023	Ort:	Datum: 04.08.2023
